

# **Project Implementation Plan**

**Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Mendukung  
Digitalisasi Layanan Kepegawaian, Pengelolaan Data, dan Barang Milik  
Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen  
Kementerian Agama RI.**

## **Dibuat Oleh :**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 12S23006 | Cardolan Sinaga        |
| 12S23020 | Rachel C.P Simorangkir |
| 12S23040 | Diana Manurung         |

**Untuk :  
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen  
Kementerian Agama RI  
Jakarta Pusat**



## Kerja Praktik 2026 Institut Teknologi Del

No. Dokumen: PIP-KP-26-103-A

Versi: xx.xx

Tanggal : 17-06-2026

Jumlah Halaman : 21

### DAFTAR ISI

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Ringkasan .....                                                | 4  |
| 1 Pendahuluan .....                                            | 6  |
| 1.1 Maksud Penulisan Dokumen .....                             | 6  |
| 1.2 Definisi, Akronim Dan Singkatan .....                      | 6  |
| 1.3 Aturan Penomoran .....                                     | 7  |
| 1.4 Dokumen Rujukan .....                                      | 8  |
| 1.5 Ikhtisar Dokumen .....                                     | 9  |
| 2 Deskripsi Umum Proyek .....                                  | 10 |
| 2.1 Latar Belakang .....                                       | 10 |
| 2.2 Tujuan .....                                               | 10 |
| 2.3 Lingkup Pekerjaan .....                                    | 10 |
| 2.4 Input Requirement .....                                    | 11 |
| 2.4.1 Sumber Daya Manusia .....                                | 11 |
| 2.4.2 Peralatan ( <i>Tools</i> ) .....                         | 11 |
| 2.4.3 Lainnya .....                                            | 12 |
| 2.5 Deliverables .....                                         | 12 |
| 3 Pengelolaan Proyek (Manajemen) .....                         | 14 |
| 3.1 Struktur Organisasi .....                                  | 14 |
| 3.2 Alokasi Personil, Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab ..... | 14 |
| 3.3 Tujuan dan Prioritas Pengelolaan Proyek .....              | 15 |
| 3.4 Asumsi, Kebergantungan dan Kendala .....                   | 15 |
| 3.5 Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian .....                | 16 |
| 4 Paket Kerja dan Jadwal .....                                 | 17 |
| 4.1 Paket Kerja .....                                          | 17 |
| 4.2 Jadwal .....                                               | 18 |
| 5 Penutup .....                                                | 19 |
| Sejarah Versi .....                                            | 20 |
| Sejarah Perubahan .....                                        | 21 |

|                                                                                                                                                                                                                        |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| IT Del                                                                                                                                                                                                                 | PIP-KP-26-103-A | Halaman 2 dari 21 |
| Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktik mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del. |                 |                   |

## DAFTAR TABEL

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Table 1.1 Daftar Definisi .....            | 6  |
| Table 1.2 Daftar Akronim .....             | 7  |
| Table 1.3 Daftar Singkatan .....           | 7  |
| Table 1.4 Aturan Penomoran.....            | 8  |
| Table 2.1 Daftar <i>Deliverables</i> ..... | 11 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.1 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Kerja Praktik ..... | 18 |
| Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pelaksanaan .....           | 18 |

|                                                                                                                                                                                                                        |                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>IT Del</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>PIP-KP-26-103-A</b> | <b>Halaman 4 dari 21</b> |
| Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktik mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del. |                        |                          |

## Ringkasan

Dokumen *Project Implementation Plan* (PIP) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan proyek Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Mendukung Digitalisasi Layanan Kepegawaian, Pengelolaan Data, dan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dokumen ini menjelaskan rencana pelaksanaan proyek yang meliputi tujuan proyek, ruang lingkup pekerjaan, kebutuhan sumber daya, hasil yang akan dicapai, mekanisme pengelolaan proyek, serta jadwal pelaksanaan kegiatan selama masa kerja praktik.

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan Portal Layanan Internal berbasis web yang mengintegrasikan layanan Kepegawaian dan SDM, Barang Milik Negara (BMN), serta Humas dan Data ke dalam satu *platform* yang terpusat. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat mendukung digitalisasi proses administrasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, serta mempermudah proses pelayanan dan monitoring kegiatan internal organisasi.

Dokumen ini terdiri atas lima bagian utama. Bagian pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan tujuan penyusunan dokumen dan referensi yang digunakan. Bagian kedua menjelaskan deskripsi umum proyek yang mencakup latar belakang, tujuan, ruang lingkup pekerjaan, kebutuhan sumber daya, dan deliverables yang akan dihasilkan. Bagian ketiga membahas pengelolaan proyek yang meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, mekanisme pengendalian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proyek. Bagian keempat menjelaskan paket kerja dan jadwal pelaksanaan proyek. Bagian terakhir berisi penutup yang menjelaskan harapan terhadap pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun.

|                                                                                                                                                                                                                        |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| IT Del                                                                                                                                                                                                                 | PIP-KP-26-103-A | Halaman 5 dari 21 |
| Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktik mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del. |                 |                   |

## 1 Pendahuluan

### 1.1 Maksud Penulisan Dokumen

Dokumen *Project Implementation Plan* (PiP) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan proyek Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Mendukung Digitalisasi Layanan Kepegawaian, Pengelolaan Data, dan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dokumen ini ditujukan kepada mahasiswa pelaksana proyek, *supervisor*, dosen pembimbing, serta pihak *owner* proyek sebagai acuan dalam memahami ruang lingkup pekerjaan, tujuan proyek, kebutuhan sumber daya, pembagian tugas, mekanisme pelaksanaan, dan jadwal kegiatan selama pelaksanaan Kerja Praktik. Melalui dokumen ini diharapkan seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai rencana pelaksanaan proyek sehingga kegiatan dapat berjalan secara terarah dan terukur.

### 1.2 Definisi, Akronim Dan Singkatan

Berikut tabel 1.1 yang berisi definisi yang digunakan dalam dokumen ini.

Table 1.1 Daftar Definisi

| Istilah                 | Definisi                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portal Layanan Internal | Sistem informasi terintegrasi yang dikembangkan untuk mendukung layanan Kepegawaian dan SDM, Barang Milik Negara (BMN), serta Humas dan Data dalam satu platform. |
| <i>User</i>             | Pengguna langsung sistem yang memanfaatkan layanan yang tersedia pada website.                                                                                    |
| <i>Owner</i>            | Pihak yang memiliki dan bertanggung jawab terhadap penggunaan sistem yang dikembangkan.                                                                           |
| <i>Supervisor</i>       | Pembimbing lapangan yang memberikan arahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek.                                                                              |
| <i>Deliverable</i>      | Produk atau dokumen yang dihasilkan selama pelaksanaan proyek.                                                                                                    |

Berikut tabel 1.2 yang berisi akronim yang digunakan dalam dokumen ini.

*Table 1.2 Daftar Akronim*

| <b>Akronim</b> | <b>Keterangan</b>                       |
|----------------|-----------------------------------------|
| BMN            | Barang Milik Negara                     |
| SDM            | Sumber Daya Manusia                     |
| KP             | Kerja Praktik                           |
| PiP            | <i>Project Implementation Plan</i>      |
| ToR            | <i>Term of Reference</i>                |
| SyRS           | <i>System Requirement Specification</i> |
| SDD            | <i>System Design Document</i>           |
| TD             | <i>Technical Document</i>               |
| UI             | <i>User Interface</i>                   |
| UX             | <i>User Experience</i>                  |

Berikut tabel 1.3 yang berisi singkatan yang digunakan dalam dokumen ini.

*Table 1.3 Daftar Singkatan*

| <b>Singkatan</b>     | <b>Keterangan</b>                                |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Ditjen Bimas Kristen | Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen |
| Kemenag RI           | Kementerian Agama Republik Indonesia             |
| API                  | <i>Application Programming Interface</i>         |
| MoM                  | <i>Minutes of Meeting</i>                        |
| IT Del               | Institut Teknologi Del                           |

### 1.3 Aturan Penomoran

Dokumen yang dikumpulkan sebagai bagian dari pengerjaan Kerja Praktik mengikuti kaidah penomoran yang dinyatakan dalam tabel 1.4.

|                                                                                                                                                                                                                        |                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>IT Del</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>PIP-KP-26-103-A</b> | <b>Halaman 7 dari 21</b> |
| Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktik mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del. |                        |                          |

Table 1.4 Aturan Penomoran

| No | Kategori                                       | Deskripsi Aturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Penamaan Dokumen                               | PiP-KP-YY-GG aturan penamaan dimana YY adalah tahun pembuatan dokumen dan GG adalah nomor kelompok. Maka dokumen ini dinamai dengan PiP-KP-26-103-A sesuai dengan ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. | Penulisan                                      | <p>a. <i>Font: Times New Roman dan Arial</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul dokumen: <i>Times New Roman, 24 pt, bold black.</i></li> <li>- Judul bab: <i>Arial, 14 pt, bold black.</i></li> <li>- Sub bab: <i>Arial, 12 pt, bold black.</i></li> <li>- Isi bab: <i>Times New Roman, 12 pt, black</i></li> <li>- Isi tabel: <i>Times New Roman, 12 pt, black.</i></li> </ul> <p>b. Paragraf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Line spacing: 1,5 pt</i></li> <li>- <i>Spacing before after: 0 pt</i></li> <li>- <i>Alignment: justified</i></li> <li>- Istilah/bahasa asing ditulis dengan format tulisan miring (<i>italic</i>).</li> <li>- Kata pertama paragraf tidak menjorok ke dalam.</li> </ul> <p>c. <i>Caption Table/Gambar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Line spacing: single, before after, 0 pt.</i></li> <li>- <i>Times New Roman, 10 pt, italic.</i></li> <li>- <i>Alignment table: center, di atas.</i></li> <li>- <i>Alignment gambar: center, di bawah.</i></li> </ul> |
| 3. | Aturan penomoran dan penamaan bab dan sub bab. | <p>a. Bab: 1,2,3 dan seterusnya.<br/>Contoh: 1 <i>Introduction</i></p> <p>b. Subbab: 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya.<br/>Contoh: 1.1 <i>Purpose of Document</i></p> <p>c. Sub subbab: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, dan seterusnya.<br/>Contoh: 2.2.1 <i>Business Process</i> Membuat Pengaduan.</p> <p>d. Penomoran dan penulisan pada tabel dan gambar.<br/>Contoh: Tabel 1.1 Daftar Definisi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 1.4 Dokumen Rujukan

Dokumen yang menjadi rujukan dalam penyusunan Project Implementation Plan ini adalah sebagai berikut:

- [1] Std-KP-26-103-A, Standard Penomoran dan Tata nama Artefak Kerja Praktik dan Tugas Akhir, Institut Teknologi Del.
- [2] ToR-KP-26-103-A, *Term of Reference* Proyek Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Mendukung Digitalisasi Layanan Kepegawaian, Pengelolaan Data,

|                                                                                                                                                                                                                        |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| IT Del                                                                                                                                                                                                                 | PIP-KP-26-103-A | Halaman 8 dari 21 |
| Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktik mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del. |                 |                   |



dan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.

- [3] MoM-KP-26-103-A, *Minutes of Meeting* proyek Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Mendukung Digitalisasi Layanan Kepegawaian, Pengelolaan Data, dan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI.

## 1.5 Ikhtisar Dokumen

Dokumen Project Implementation Plan (PiP) ini terdiri atas lima bab utama.

1. Bab 1 - Pendahuluan menjelaskan tujuan penyusunan dokumen, definisi dan istilah yang digunakan, dokumen rujukan, serta gambaran umum isi dokumen.
2. Bab 2 - Deskripsi Umum Proyek menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup pekerjaan, kebutuhan sumber daya, serta deliverables yang akan dihasilkan selama pelaksanaan proyek.
3. Bab 3 - Pengelolaan Proyek membahas struktur organisasi proyek, pembagian tugas dan tanggung jawab, tujuan pengelolaan proyek, asumsi dan kendala yang dihadapi serta mekanisme pemantauan dan pengendalian proyek.
4. Bab 4 - Paket Kerja dan Jadwal menjelaskan paket-paket pekerjaan yang akan dilaksanakan serta jadwal pelaksanaan proyek selama masa Kerja Praktik.
5. Bab 5 - Penutup berisi kesimpulan dan harapan terhadap pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun.

| IT Del                                                                                                                                                                                                                 | PIP-KP-26-103-A | Halaman 9 dari 21 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktik mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del. |                 |                   |

## 2 Deskripsi Umum Proyek

### 2.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki berbagai layanan administrasi internal yang mendukung operasional organisasi, khususnya pada bidang Kepegawaian dan SDM, Barang Milik Negara (BMN), serta Humas dan Data. Saat ini sebagian besar proses layanan masih dilakukan menggunakan Google Form dan pengelolaan data secara terpisah, sehingga menyebabkan proses administrasi kurang efektif, data tersebar pada berbagai sumber, serta menyulitkan monitoring dan pengelolaan informasi secara terintegrasi.

Untuk mendukung transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan internal, diperlukan pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi yang mampu menggabungkan layanan Kepegawaian dan SDM, Barang Milik Negara (BMN), serta Humas dan Data ke dalam satu platform berbasis web. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempermudah pengelolaan data dan dokumen, serta mendukung proses monitoring dan pelaporan secara lebih efektif.

### 2.2 Tujuan

Tujuan proyek ini adalah:

1. Mengembangkan Portal Layanan Internal berbasis web yang mengintegrasikan layanan Kepegawaian dan SDM, Barang Milik Negara (BMN), serta Humas dan Data.
2. Mendukung digitalisasi proses administrasi yang sebelumnya masih dilakukan secara terpisah.
3. Mempermudah proses pengajuan layanan dan pengelolaan data oleh pengguna.
4. Meningkatkan efisiensi, akurasi dan transparansi dalam pengelolaan layanan internal.
5. Menyediakan sistem yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan organisasi.

### 2.3 Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan dalam proyek ini meliputi:

1. Pengumpulan kebutuhan pengguna melalui observasi, wawancara, dan diskusi dengan pihak terkait.
2. Analisis arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka pengguna.
3. Perancangan arsitektur sistem, basis data, dan antarmuka pengguna.
4. Pengembangan Portal Layanan Internal sebagai pusat akses layanan.
5. Pengembangan modul Kepegawaian dan SDM.
6. Pengembangan modul Barang Milik Negara (BMN).
7. Pengembangan modul Humas dan Data.
8. Pengujian sistem dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
9. Penyusunan dokumentasi teknis dan dokumentasi pengguna.
10. Penyusunan laporan akhir dan presentasi hasil proyek.

|                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| IT Del                                                                                                                                                                                                                 | PIP-KP-26-103-A | Halaman 10 dari 21 |
| Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktik mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del. |                 |                    |

11. Pengembangan frontend menggunakan React.js dan Vite.
12. Pengembangan backend menggunakan CodeIgniter 4 berbasis REST API.
13. Integrasi frontend, backend, dan basis data untuk mendukung seluruh layanan pada Portal Layanan Internal.

## 2.4 Input Requirement

Pelaksanaan proyek Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi untuk mendukung Digitalisasi Layanan Kepegawaian, Pengelolaan Data, dan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia memerlukan berbagai sumber daya yang mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek. Kebutuhan tersebut meliputi sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak, serta data dan informasi yang digunakan sebagai dasar dalam proses analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan dokumentasi sistem. Adapun kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek ini dijelaskan pada subbab berikut.

### 2.4.1 Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan proyek ini membutuhkan sumber daya manusia yang terdiri atas supervisor, mahasiswa pelaksana kerja praktik, serta perwakilan pengguna dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Supervisor berperan dalam memberikan arahan, evaluasi, dan verifikasi terhadap pelaksanaan proyek. Mahasiswa kerja praktik bertanggung jawab dalam kegiatan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian dan dokumentasi sistem. Sementara itu, perwakilan pengguna berperan dalam memberikan informasi terkait kebutuhan sistem serta melakukan validasi terhadap hasil pengembangan yang dilakukan.

### 2.4.2 Peralatan (*Tools*)

Pelaksanaan proyek memerlukan perangkat keras berupa laptop atau komputer yang memiliki kemampuan untuk mendukung proses pengembangan aplikasi berbasis web. Perangkat yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan aplikasi berbasis web. Perangkat yang digunakan minimal memiliki prosesor setara Intel Core i5, RAM minimal 8 GB, penyimpanan SSD minimal 256 GB, serta koneksi internet yang stabil.

Selain perangkat keras, proyek ini juga memanfaatkan berbagai perangkat lunak pendukung seperti Windows 10/11 sebagai sistem operasi, Visual Studio Code sebagai code editor, React.js dan Vite untuk pengembangan antarmuka pengguna (*frontend*), CodeIgniter 4 sebagai framework pengembangan backend, MySQL/PostgreSQL sebagai basis data, Git dan GitHub untuk pengelolaan source code dan kolaborasi tim, Google Chrome untuk pengujian aplikasi, Figma untuk perancangan antarmuka pengguna, serta Microsoft Office untuk penyusunan dokumen proyek.

|                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| IT Del                                                                                                                                                                                                                 | PIP-KP-26-103-A | Halaman 11 dari 21 |
| Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktik mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del. |                 |                    |

### 2.4.3 Lainnya

Selain sumber daya manusia dan perangkat pendukung, proyek ini juga membutuhkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan diskusi dengan pihak terkait. Data tersebut meliputi informasi mengenai layanan Kepegawaian dan SDM, Barang Milik Negara (BMN), serta Humas dan Data yang saat ini berjalan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, dokumen layanan saat ini digunakan, referensi sistem sejenis, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan proses administrasi juga diperlukan sebagai bahan dalam proses analisis dan pengembangan sistem.

### 2.5 Deliverables

Deliverables merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan proyek ini. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 yang mencakup output utama dan dokumen pendukung yang menunjukkan pencapaian tiap tahapan kerja.

Table 2.1 Daftar Deliverables

| Deliv.Id         | Deliverables                            | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ToR-KP-26-103-A  | <i>Term of Reference</i>                | Dokumen yang mengatur ruang lingkup, tujuan, metodologi, serta <i>deliverables</i> yang diharapkan dari proyek ini.                                                                                                                          |
| PIP-KP-26-103-A  | <i>Project Implementation plan</i>      | Rencana implementasi yang merinci langkah-langkah, jadwal, alokasi sumber daya serta pembagian tugas untuk memastikan pencapaian hasil yang diinginkan.                                                                                      |
| Rep-KP-26-103-A  | Laporan Kerja Praktik                   | Laporan kerja praktik yang merangkum hasil dari kegiatan yang dilakukan, termasuk analisis, temuan, serta rekomendasi terkait dengan proyek.                                                                                                 |
| SyRS-KP-26-103-A | <i>System Requirement Specification</i> | Dokumen yang menjelaskan spesifikasi kebutuhan sistem secara rinci, mencakup kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, batasan sistem, serta karakteristik sistem yang akan dikembangkan sebagai dasar proses desain dan implementasi. |


| <b>Deliv.Id</b> | <b>Deliverables</b>           | <b>Keterangan</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SDD-KP-26-103-A | <i>System Design Document</i> | Dokumen yang menjelaskan rancangan sistem yang akan dikembangkan, mencakup arsitektur sistem, desain basis data, desain antarmuka pengguna, diagram sistem, serta komponen-komponen yang digunakan sebagai pedoman dalam proses implementasi sistem. |

### 3 Pengelolaan Proyek (Manajemen)

Pada bagian ini, akan diuraikan struktur organisasi, alokasi personil, deskripsi tugas dan tanggung jawab, tujuan dan prioritas proyek, asumsi dan kebergantungan, kendala yang dihadapi, serta mekanisme pemantauan dan pengendalian selama proses pengerjaan proyek.

#### 3.1 Struktur Organisasi

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pelaksanaan

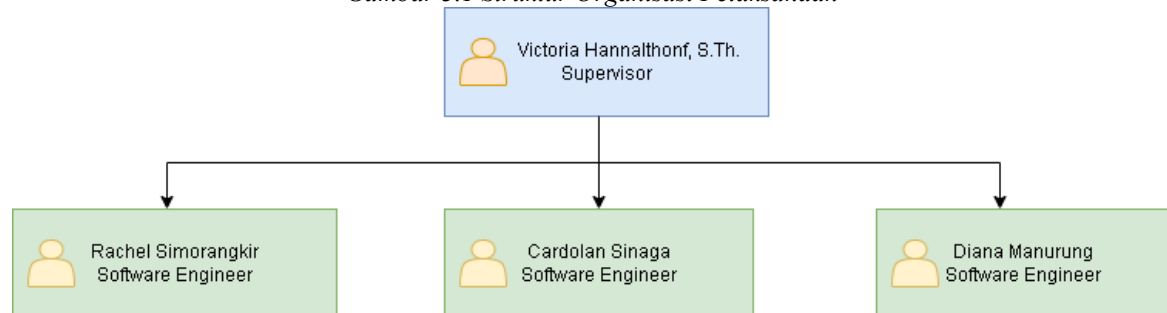

#### 3.2 Alokasi Personil, Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut tabel 3.1 yaitu detail deskripsi tugas dan tanggung jawab setiap personil.

Tabel 3.1 Daftar Tugas dan Tanggung Jawab Setiap Persoil.

| Personil                           | Jabatan                  | Tugas dan Tanggung jawab                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Victoria Hannalthonf, S.Th.        | <i>Supervisor</i>        | Memberikan arahan, masukan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek. Memastikan proyek berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan serta melakukan verifikasi terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh tim.                                             |
| Rachel Christia Pandan Simorangkir | <i>Software Engineer</i> | Bertanggung jawab dalam analisis kebutuhan sistem, bertanggung jawab dalam pengembangan backend menggunakan CodeIgniter 4, pengembangan modul Kepegawaian dan SDM, penyusunan dokumentasi proyek, serta melakukan pengujian terhadap fitur yang dikembangkan. |
| Cardolan Sinaga                    | <i>Software Engineer</i> | Bertanggung jawab dalam analisis kebutuhan, perancangan antarmuka pengguna (UI/UX), perancangan dan pengembangan modul Humas dan Data, penyusunan dokumentasi teknis, pengujian sistem, serta membantu proses                                                 |

|                |                          |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                          | integrasi dan validasi aplikasi secara keseluruhan.                                                                                                                                                                            |
| Diana Manurung | <i>Software Engineer</i> | Bertanggung jawab dalam analisis kebutuhan, perancangan dan pengembangan modul Barang Milik Negara (BMN), perancangan antarmuka pengguna (UI/UX), integrasi sistem, pengelolaan basis data, serta pengujian fungsional sistem. |

### 3.3 Tujuan dan Prioritas Pengelolaan Proyek

Pengelolaan proyek dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas pengembangan sistem dapat berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengelolaan proyek adalah memastikan penyelesaian proyek tepat waktu, menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta menghasilkan dokumentasi yang lengkap dan berkualitas.

Prioritas dalam pengelolaan proyek meliputi:

1. Penyelesaian proyek sesuai jadwal pelaksanaan Kerja Praktik.
2. Kesesuaian hasil pengembangan dengan kebutuhan dihasilkan.
3. Kualitas website dan dokumentasi yang dihasilkan.
4. Koordinasi dan komunikasi yang efektif antar anggota tim dan supervisor.
5. Pengelolaan perubahan yang terkontrol selama proses pengembangan.

### 3.4 Asumsi, Kebergantungan dan Kendala

Pelaksanaan proyek ini didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, tersedianya akses kepada pengguna untuk proses pengumpulan kebutuhan dan validasi sistem, serta seluruh anggota tim dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pembagian pekerjaan yang telah ditetapkan. Selain itu, diasumsikan bahwa perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang digunakan selama proses pengembangan dapat berfungsi dengan baik.

Keberhasilan proyek ini memiliki ketergantungan terhadap ketersediaan kebutuhan bisnis dan data yang diberikan oleh masing-masing unit kerja, yaitu Kepegawaian dan SDM, Barang Milik Negara (BMN), serta Humas dan Data. Selain itu, proses pengembangan sistem juga bergantung pada hasil diskusi, masukan, serta persetujuan dari supervisor dan pihak pengguna sebagai dasar dalam proses analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem. Integrasi antara *frontend* berbasis React.js, backend

berbasis CodeIgniter 4, dan basis data juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem secara keseluruhan.

Adapun kendala yang berpotensi dihadapi selama pelaksanaan proyek antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan Kerja Praktik, kemungkinan adanya perubahan kebutuhan pengguna selama proses pengembangan, keterbatasan akses terhadap data yang bersifat internal, serta penyesuaian jadwal koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, terdapat risiko teknis seperti kendala integrasi antara frontend dan backend, perubahan kebutuhan sistem yang memerlukan penyesuaian desain maupun implementasi, serta potensi ditemukannya bug atau error selama proses pengembangan dan pengujian sistem. Untuk meminimalkan dampak dari kendala tersebut, tim akan melakukan koordinasi secara berkala, dokumentasi perubahan kebutuhan, serta pengujian sistem secara bertahap pada setiap modul yang dikembangkan.

### **3.5 Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian**

Pemantauan proyek dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Setiap anggota tim diwajibkan mencatat aktivitas harian dan perkembangan pekerjaan dalam *log activity* sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan proyek.

Selain itu, dilakukan koordinasi rutin dengan supervisor untuk membahas perkembangan pekerjaan kendala yang dihadapi, serta solusi yang diperlukan. Hasil koordinasi didokumentasikan dalam bentuk catatan pertemuan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

Pengendalian mutu dilakukan melalui proses review terhadap dokumen maupun website yang dikembangkan. Setiap fitur yang selesai dikembangkan akan diuji terlebih dahulu sebelum diintegrasikan ke dalam sistem utama untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna.

Pengendalian dokumen dilakukan dengan mengelola versi dokumen secara teratur. Mengingat waktu pelaksanaan proyek yang relatif singkat, perubahan terhadap dokumen *Project Implementation Plan* (PiP) dilakukan maksimal satu kali setelah versi draft, sehingga menghasilkan satu versi final yang menjadi acuan pelaksanaan proyek.

|                                                                                                                                                                                                                        |                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>IT Del</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>PIP-KP-26-103-A</b> | <b>Halaman 16 dari 21</b> |
| Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktik mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del. |                        |                           |



## 4 Paket Kerja dan Jadwal

Bab ini menjelaskan paket kerja yang dilaksanakan selama proyek berlangsung beserta jadwal pelaksanaannya. Paket kerja disusun berdasarkan aktivitas utama yang dilakukan dalam pengembangan Portal Layanan Internal yang mencakup layanan Kepegawaian dan SDM, Barang Milik Negara (BMN), serta Humas dan Data. Setiap paket kerja terdiri atas serangkaian kegiatan yang saling berkaitan mulai dari persiapan, pengumpulan kebutuhan, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, hingga penyusunan laporan dan serah terima hasil proyek.

### 4.1 Paket Kerja

Dalam pelaksanaan proyek Pengembangan Portal Layanan Internal, pekerjaan dibagi ke dalam beberapa paket kerja yang saling berkaitan. Setiap paket kerja dilakukan secara bertahap untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat berfungsi dengan baik.

- Persiapan, dilakukan untuk memahami ruang lingkup proyek, tujuan pengembangan, serta kebutuhan awal yang harus dipenuhi. Pada tahap ini dilakukan koordinasi dengan *supervisor*, penentuan metode kerja, pembagian tugas anggota tim, serta penyusunan dokumen awal seperti *Term of Reference (ToR)* dan *Project Implementation Plan (PiP)*.
- Survey, dilakukan dengan mengumpulkan informasi terkait proses bisnis dan layanan yang berjalan pada divisi Kepegawaian dan SDM, Barang Milik Negara (BMN), serta Humas dan Data. Kegiatan dilakukan melalui observasi, wawancara, diskusi dengan pihak terkait, dan pengumpulan dokumen yang digunakan dalam proses layanan saat ini.
- Analisis, dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan permasalahan yang terdapat pada proses layanan yang berjalan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam penyusunan *System Requirement Specification (SyRS)*.
- Perancangan, dilakukan dengan menyusun desain sistem yang akan dikembangkan. Kegiatan yang dilakukan meliputi perancangan arsitektur sistem, desain basis data, desain antar muka pengguna (UI/UX), diagram sistem, serta penyusunan *System Design Document (SDD)*.
- Implementasi, dilakukan dengan membangun sistem berdasarkan hasil analisis dan desain yang telah disusun. Pada tahap ini dilakukan pengembangan Portal Layanan Internal beserta modul Kepegawaian dan SDM, Barang Milik Negara (BMN), serta Humas dan Data menggunakan teknologi yang telah ditentukan.
- *Testing*, dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan terhadap setiap modul yang dikembangkan, integrasi antar modul, serta validasi hasil sistem berdasarkan skenario penggunaan yang telah ditentukan.
- Pelaporan dan serah terima, dilakukan dengan menyusun seluruh dokumentasi proyek, termasuk laporan Kerja Praktik dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu dilakukan

|                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| IT Del                                                                                                                                                                                                                 | PIP-KP-26-103-A | Halaman 17 dari 21 |
| Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktik mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del. |                 |                    |

presentasi hasil proyek kepada *supervisor* dan pihak terkait serta penyerahan produk yang telah dikembangkan.

## 4.2 Jadwal

Rencana jadwal kegiatan pada masa pelaksanaan Kerja Praktik pada perusahaan dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Kerja Praktik

| Kegiatan                          | Bulan |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
|-----------------------------------|-------|---|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|
|                                   | Juni  |   |   |   | Juli |   |   |   | Agustus |   |   |   |
|                                   | 1     | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |
| <b>Persiapan</b>                  |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Penentuan Prosedur Kerja          |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Penyusunan ToR dan PiP            |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| <b>Survey</b>                     |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Penerimaan Data                   |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Pemahaman Kondisi Data            |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| <b>Analisis</b>                   |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Data Understanding                |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Analisis Kebutuhan Sistem         |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Penyusunan SyRS                   |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| <b>Perancangan</b>                |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Desain UI/UX                      |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Desain Basis Data                 |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Penyusunan SDD                    |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| <b>Implementasi</b>               |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Pengembangan Frontend             |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Pengembangan Backend              |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Integrasi Sistem                  |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| <b>Testing</b>                    |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Pengujian Sistem                  |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Perbaikan Bug                     |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| <b>Pelaporan dan Serah Terima</b> |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Penyusunan laporan KP             |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |
| Presentasi dan Serah Terima       |       |   |   |   |      |   |   |   |         |   |   |   |

## 5 Penutup

*Project Implementation Plan* (PIP) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan proyek Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Mendukung Digitalisasi Layanan Kepegawaian, Pengelolaan Data, dan Barang Milik Negara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam memahami tujuan, ruang lingkup, pembagian tugas, kebutuhan sumber daya, serta jadwal pelaksanaan proyek.

Dengan adanya PIP ini, diharapkan seluruh kegiatan pengembangan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terkoordinasi dengan baik sehingga menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam proses pemantauan, pengendalian, dan evaluasi proyek selama masa Kerja Praktik berlangsung.

Melalui kerja sama yang baik antara tim pelaksana, *supervisor*, dan pihak pengguna, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung transformasi digital layanan internal serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia.

|                                                                                                                                                                                                                        |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| IT Del                                                                                                                                                                                                                 | PIP-KP-26-103-A | Halaman 19 dari 21 |
| Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Kerja Praktik mahasiswa Institut Teknologi Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del. |                 |                    |

## Sejarah Versi

No. dokumen :

| No. versi | Tanggal | Ditulis Oleh | Direview Oleh | Disetujui oleh |
|-----------|---------|--------------|---------------|----------------|
|           |         |              |               |                |
|           |         |              |               |                |
|           |         |              |               |                |
|           |         |              |               |                |
|           |         |              |               |                |

## Sejarah Perubahan

No. dokumen :

No. versi :

| Halaman | Semula | Menjadi | Alasan perubahan |
|---------|--------|---------|------------------|
|         |        |         |                  |
|         |        |         |                  |
|         |        |         |                  |
|         |        |         |                  |
|         |        |         |                  |

No. dokumen :

No. versi :

| Halaman | Semula | Menjadi | Alasan perubahan |
|---------|--------|---------|------------------|
|         |        |         |                  |
|         |        |         |                  |
|         |        |         |                  |
|         |        |         |                  |
|         |        |         |                  |
